
MUSTER – fiktives Projekt, nicht zur Einreichung · Wattpol (www.wattpol.de)

PV Anlage ohne Speicher

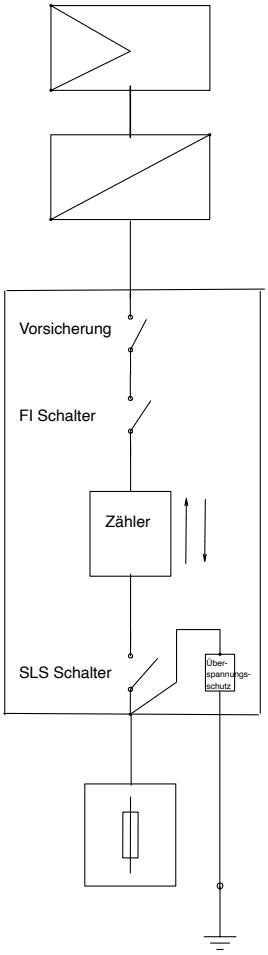

PV Module
Hersteller: _____
TYP: _____
Leistung pro Modul: _____
Gesamtleistung: _____

Wechselrichter
Hersteller: _____
TYP: _____
Gesamtleistung: _____

Zähleranlage Aufbau
Vorsicherung:
O 3xB10A O B10A
O 3xB16A O B16A
O 3xB20A
O 3xB25A

Fi- Schalter:
O 3pol. 40A/30mA
O 1pol. 16A/30mA

Zähler:
2 Richtungszähler


SLS Schalter:
O 3pol. 35A
O 3pol. 50A
O 3pol. 63A

Überspannungschutz vorhanden:
O Ja
O Nein

HAK Vorsicherung:
O 3x35A
O 3x50A
O 3x62A

Zusatzinformation:
1. NA Schutz integriert

PV Anlage mit Speicher

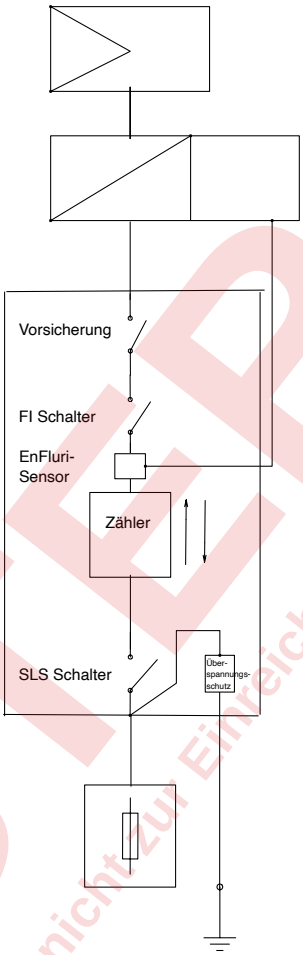

PV Module
Hersteller: Musterhersteller
TYP: MM-450
Leistung pro Modul: 450 Wp
Gesamtleistung: 9,9 kWp

Wechselrichter
Hersteller: Musterhersteller
TYP: Hybrid-WR 8.0
Gesamtleistung: 8 kVA
Speicher
Hersteller: Musterhersteller
TYP: Batterie 10.0
Gesamtleistung: 10 kWh

Zähleranlage Aufbau
Vorsicherung:
O 3xB10A O B10A
O 3xB16A O B16A
O 3xB20A
O 3xB25A

Fi- Schalter:
O 3pol. 40A/30mA
O 1pol. 16A/30mA

Zähler:
2 Richtungszähler

SLS Schalter:
O 3pol. 35A
O 3pol. 50A
O 3pol. 63A

Überspannungschutz vorhanden:
O Ja
O Nein

HAK Vorsicherung:
O 3x35A
O 3x50A
X 3x62A

Zusatzinformation:
1. NA Schutz integriert
2. Keine Netzersatzfunktion (Notstrom)

MUSTER
fiktives Projekt, nicht zur Einreichung

MUSTER – fiktives Projekt, nicht zur Einreichung · Wattpol (www.wattpol.de)

Signaturprotokoll

Übersichtsschaltplan (einpolig) · P-EMJ-MUSTER-0001 · Musterstraße 1, 23879 Musterhausen

Dokument	SP_Uebersichtsschaltplan.pdf
Prüfsumme des Dokuments (SHA-256)	ae665ce9338d325611799c80e2fe3b536e4eb9e5ba1326af8e8dc4faef967d5a
Anlagenbetreiber / Anschlussnehmer	Erika Musterfrau
Zeitpunkt	16.11.2026 10:12:31 Uhr
IP-Adresse	192.0.2.24
Prüfsumme (SHA-256)	0a1bd143a34defb2237a3fb0b8d3324bead693b49ee6e631b78cec9782cc1ed9
Errichter (Ihr Elektromeister)	Max Mustermeister
Zeitpunkt	16.11.2026 10:41:07 Uhr
IP-Adresse	192.0.2.81
Prüfsumme (SHA-256)	207107634c9bd6ad1a41333155b88dabec15f8b231c471c33a4f6ea5b64d34ff

Die Unterschriften wurden über einen persönlichen Link gezeichnet; Name, Zeitpunkt, IP-Adresse und Prüfsumme sind gespeichert. Ohne Unterschriftsfeld im Vordruck gilt dieses Protokoll. MUSTER: Personen, Anlage, Netzbetreiber und Unterschriften sind erfunden.

MUSTER
fiktives Projekt, nicht zur Einreichung
